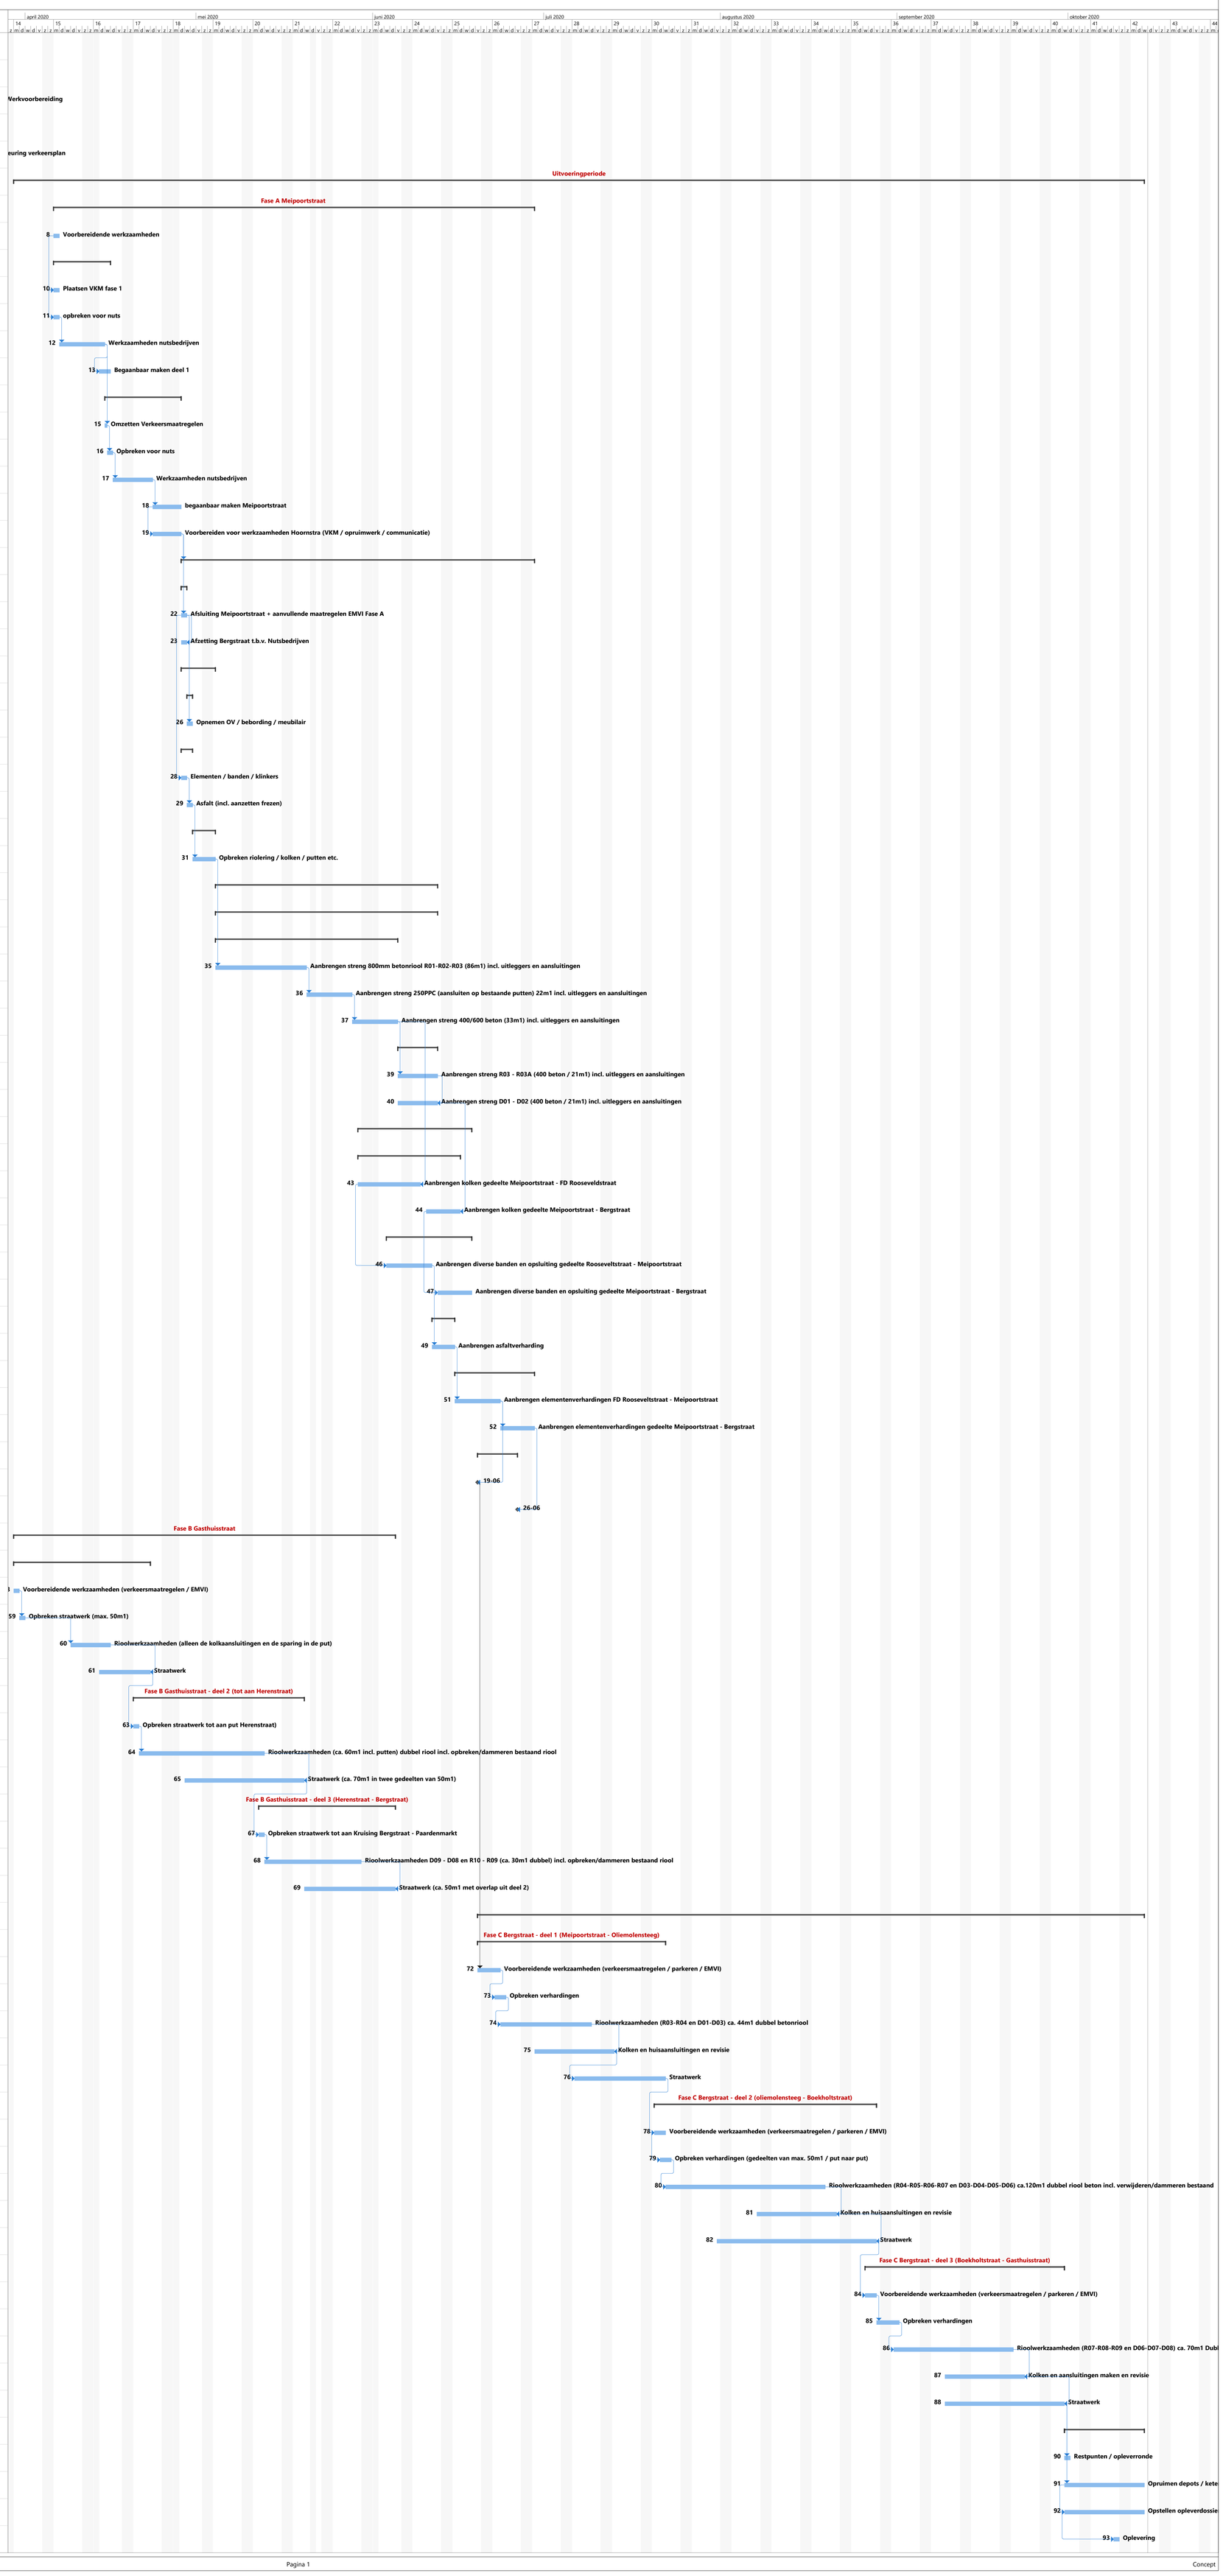Id	Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**1**	**Voorbereidingsfase**	**14 dagen**	**din 10-03-20**	**vri 27-03-20**	
2	2	Definitieve gunning	1 dag	din 10-03-20	din 10-03-20	
3	3	Werkvoorbereiding	14 dagen	din 10-03-20	vri 27-03-20	
4	4	Indienen verkeersplan	1 dag	vri 13-03-20	vri 13-03-20	
5	5	Goedkeuring verkeersplan	1 dag	din 24-03-20	din 24-03-20	4BE+6 dagen
6	**6**	**Uitvoeringperiode**	**138,2 dagen**	**maa 30-03-20**	**woe 14-10-20**	
7	**7**	**Fase A Meipoortstraat**	**56,2 dagen**	**maa 06-04-20**	**maa 29-06-20**	
8	8	Voorbereidende werkzaamheden	1 dag	maa 06-04-20	maa 06-04-20	
9	**9**	**Deel 1 nuts (voorrangsregeling)**	**7 dagen**	**maa 06-04-20**	**woe 15-04-20**	
10	10	Plaatsen VKM fase 1	1 dag	maa 06-04-20	maa 06-04-20	8GB
11	11	opbreken voor nuts	1 dag	maa 06-04-20	maa 06-04-20	10GB
12	12	Werkzaamheden nutsbedrijven	5 dagen	din 07-04-20	din 14-04-20	11
13	13	Begaanbaar maken deel 1	2 dagen	din 14-04-20	woe 15-04-20	12BE-1 dag
14	**14**	**Deel B nuts (voorrangsregeling)**	**8,2 dagen**	**woe 15-04-20**	**din 28-04-20**	
15	15	Omzetten Verkeersmaatregelen	0,2 dagen	woe 15-04-20	woe 15-04-20	12
16	16	Opbreken voor nuts	1 dag	woe 15-04-20	don 16-04-20	15
17	17	Werkzaamheden nutsbedrijven	5 dagen	don 16-04-20	don 23-04-20	16
18	18	begaanbaar maken Meipoortstraat	2 dagen	don 23-04-20	din 28-04-20	17
19	19	Voorbereiden voor werkzaamheden Hoornstra (VKM / opruimwerk / communicatie)	2 dagen	don 23-04-20	din 28-04-20	18GB
20	**20**	**Werkzaamheden Hoornstra Meipoortstraat ri. Bergstraat**	**42 dagen**	**din 28-04-20**	**maa 29-06-20**	**19**
21	**21**	**Verkeersmaatregelen**	**1 dag**	**din 28-04-20**	**woe 29-04-20**	
22	22	Afsluiting Meipoortstraat + aanvullende maatregelen EMVI Fase A	1 dag	din 28-04-20	woe 29-04-20	19BE-1 dag
23	23	Afzetting Bergstraat t.b.v. Nutsbedrijven	1 dag	din 28-04-20	woe 29-04-20	22GE
24	**24**	**Opbreken**	**4 dagen**	**din 28-04-20**	**maa 04-05-20**	
25	**25**	**Opnemen / opbreken overige**	**1 dag**	**woe 29-04-20**	**don 30-04-20**	
26	26	Opnemen OV / bebording / meubilair	1 dag	woe 29-04-20	don 30-04-20	22
27	**27**	**Opbreken verhardingen**	**2 dagen**	**din 28-04-20**	**don 30-04-20**	
28	28	Elementen / banden / klinkers	1 dag	din 28-04-20	woe 29-04-20	22GB
29	29	Asfalt (incl. aanzetten frezen)	1 dag	woe 29-04-20	don 30-04-20	28
30	**30**	**Opbreken rioleren / putten etc...**	**2 dagen**	**don 30-04-20**	**maa 04-05-20**	
31	31	Opbreken riolering / kolken / putten etc.	2 dagen	don 30-04-20	maa 04-05-20	29
32	**32**	**Riolering**	**27 dagen**	**maa 04-05-20**	**vri 12-06-20**	
33	**33**	**Aanbrengen betonriool + putten HWA**	**27 dagen**	**maa 04-05-20**	**vri 12-06-20**	
34	**34**	**t.b.v. gedeelte FD Rooseveltstraat - Meipoortstraat**	**22 dagen**	**maa 04-05-20**	**vri 05-06-20**	
35	35	Aanbrengen streng 800mm betonriool R01-R02-R03 (86m1) incl. uitleggers en aansluitingen	12 dagen	maa 04-05-20	woe 20-05-20	31
36	36	Aanbrengen streng 250PPC (aansluiten op bestaande putten) 22m1 incl. uitleggers en aansluitingen	5 dagen	woe 20-05-20	don 28-05-20	35
37	37	Aanbrengen streng 400/600 beton (33m1) incl. uitleggers en aansluitingen	5 dagen	don 28-05-20	vri 05-06-20	36
38	**38**	**t.b.v. gedeelte Meipoortstraat - Bergstraat**	**5 dagen**	**vri 05-06-20**	**vri 12-06-20**	
39	39	Aanbrengen streng R03 - R03A (400 beton / 21m1) incl. uitleggers en aansluitingen	5 dagen	vri 05-06-20	vri 12-06-20	37
40	40	Aanbrengen streng D01 - D02 (400 beton / 21m1) incl. uitleggers en aansluitingen	5 dagen	vri 05-06-20	vri 12-06-20	39GE
41	**41**	**Afwatering en straatwerk**	**13 dagen**	**vri 29-05-20**	**don 18-06-20**	
42	**42**	**Kolken en goten**	**11 dagen**	**vri 29-05-20**	**din 16-06-20**	
43	43	Aanbrengen kolken gedeelte Meipoortstraat - FD Rooseveldstraat	6 dagen	vri 29-05-20	din 09-06-20	37GE+2 dagen
44	44	Aanbrengen kolken gedeelte Meipoortstraat - Bergstraat	4 dagen	woe 10-06-20	din 16-06-20	40GE+2 dagen
45	**45**	**Banden en opsluiting**	**11 dagen**	**woe 03-06-20**	**don 18-06-20**	
46	46	Aanbrengen diverse banden en opsluiting gedeelte Rooseveltstraat - Meipoortstraat	6 dagen	woe 03-06-20	don 11-06-20	43GB+2 dagen
47	47	Aanbrengen diverse banden en opsluiting gedeelte Meipoortstraat - Bergstraat	4 dagen	vri 12-06-20	don 18-06-20	44GB+2 dagen
48	**48**	**Asfaltverharding**	**2 dagen**	**don 11-06-20**	**maa 15-06-20**	
49	49	Aanbrengen asfaltverharding	2 dagen	don 11-06-20	maa 15-06-20	46
50	**50**	**Elementenverharding**	**10 dagen**	**maa 15-06-20**	**maa 29-06-20**	
51	51	Aanbrengen elementenverhardingen FD Rooseveltstraat - Meipoortstraat	6 dagen	maa 15-06-20	din 23-06-20	49
52	52	Aanbrengen elementenverhardingen gedeelte Meipoortstraat - Bergstraat	4 dagen	din 23-06-20	maa 29-06-20	51
53	**53**	**Openstellen wegvak**	**5 dagen**	**vri 19-06-20**	**vri 26-06-20**	
54	54	Openstellen FD Rooseveltstraat - Meipoortstraat voor doorgaand verkeer	0 dagen	vri 19-06-20	vri 19-06-20	51GE-2 dagen
55	55	Openstellen Meipoortstraat gedeelte Bergstraat	0 dagen	vri 26-06-20	vri 26-06-20	52GE-1 dag
56	**56**	**Fase B Gasthuisstraat**	**45 dagen**	**maa 30-03-20**	**don 04-06-20**	
57	**57**	**Deel 1 (tpv de Waag)**	**17 dagen**	**maa 30-03-20**	**woe 22-04-20**	
58	58	Voorbereidende werkzaamheden (verkeersmaatregelen / EMVI)	1 dag	maa 30-03-20	maa 30-03-20	
59	59	Opbreken straatwerk (max. 50m1)	1 dag	din 31-03-20	din 31-03-20	58
60	60	Rioolwerkzaamheden (alleen de kolkaansluitingen en de sparing in de put)	4 dagen	don 09-04-20	woe 15-04-20	59
61	61	Straatwerk	7 dagen	din 14-04-20	woe 22-04-20	60GE+5 dagen
62	**62**	**Fase B Gasthuisstraat - deel 2 (tot aan Herenstraat)**	**21 dagen**	**maa 20-04-20**	**din 19-05-20**	
63	63	Opbreken straatwerk tot aan put Herenstraat)	1 dag	maa 20-04-20	maa 20-04-20	61BE-3 dagen
64	64	Rioolwerkzaamheden (ca. 60m1 incl. putten) dubbel riool incl. opbreken/dammeren bestaand riool	15 dagen	din 21-04-20	din 12-05-20	63
65	65	Straatwerk (ca. 70m1 in twee gedeelten van 50m1)	15 dagen	woe 29-04-20	din 19-05-20	64GE+5 dagen
66	**66**	**Fase B Gasthuisstraat - deel 3 (Herenstraat - Bergstraat)**	**16 dagen**	**din 12-05-20**	**don 04-06-20**	
67	67	Opbreken straatwerk tot aan Kruising Bergstraat - Paardenmarkt	1 dag	din 12-05-20	din 12-05-20	65BE-6 dagen
68	68	Rioolwerkzaamheden D09 - D08 en R10 - R09 (ca. 30m1 dubbel) incl. opbreken/dammeren bestaand riool	12 dagen	woe 13-05-20	vri 29-05-20	67
69	69	Straatwerk (ca. 50m1 met overlap uit deel 2)	10 dagen	woe 20-05-20	don 04-06-20	68GE+3 dagen
70	**70**	**Fase C BERGSTRAAT**	**83 dagen**	**vri 19-06-20**	**woe 14-10-20**	
71	**71**	**Fase C Bergstraat - deel 1 (Meipoortstraat - Oliemolensteeg)**	**23 dagen**	**vri 19-06-20**	**woe 22-07-20**	
72	72	Voorbereidende werkzaamheden (verkeersmaatregelen / parkeren / EMVI)	2 dagen	vri 19-06-20	din 23-06-20	54
73	73	Opbreken verhardingen	2 dagen	maa 22-06-20	woe 24-06-20	72BE-1 dag
74	74	Rioolwerkzaamheden (R03-R04 en D01-D03) ca. 44m1 dubbel betonriool	12 dagen	din 23-06-20	don 09-07-20	73BE-1 dag
75	75	Kolken en huisaansluitingen en revisie	10 dagen	maa 29-06-20	maa 13-07-20	74GE+2 dagen
76	76	Straatwerk	12 dagen	maa 06-07-20	woe 22-07-20	75BE-5 dagen
77	**77**	**Fase C Bergstraat - deel 2 (oliemolensteeg - Boekholtstraat)**	**29 dagen**	**maa 20-07-20**	**vri 28-08-20**	
78	78	Voorbereidende werkzaamheden (verkeersmaatregelen / parkeren / EMVI)	2 dagen	maa 20-07-20	woe 22-07-20	76BE-2 dagen
79	79	Opbreken verhardingen (gedeelten van max. 50m1 / put naar put)	2 dagen	din 21-07-20	don 23-07-20	78GB+1 dag
80	80	Rioolwerkzaamheden (R04-R05-R06-R07 en D03-D04-D05-D06) ca.120m1 dubbel riool beton incl. verwijderen/dammeren bestaand	20 dagen	woe 22-07-20	woe 19-08-20	79BE-1 dag
81	81	Kolken en huisaansluitingen en revisie	10 dagen	vri 07-08-20	vri 21-08-20	80GE+2 dagen
82	82	Straatwerk	20 dagen	vri 31-07-20	vri 28-08-20	81GE+5 dagen
83	**83**	**Fase C Bergstraat - deel 3 (Boekholtstraat - Gasthuisstraat)**	**25 dagen**	**woe 26-08-20**	**woe 30-09-20**	
84	84	Voorbereidende werkzaamheden (verkeersmaatregelen / parkeren / EMVI)	2 dagen	woe 26-08-20	vri 28-08-20	82BE-2 dagen
85	85	Opbreken verhardingen	2 dagen	vri 28-08-20	din 01-09-20	84
86	86	Rioolwerkzaamheden (R07-R08-R09 en D06-D07-D08) ca. 70m1 Dubbel riool incl. verwijderen/dammeren bestaand riool	15 dagen	maa 31-08-20	maa 21-09-20	85BE-1 dag
87	87	Kolken en aansluitingen maken en revisie	10 dagen	woe 09-09-20	woe 23-09-20	86GE+2 dagen
88	88	Straatwerk	15 dagen	woe 09-09-20	woe 30-09-20	87GE+5 dagen
89	**89**	**Afronding**	**10 dagen**	**woe 30-09-20**	**woe 14-10-20**	
90	90	Restpunten / opleverronde	1 dag	woe 30-09-20	don 01-10-20	88
91	91	Opruimen depots / keten	10 dagen	woe 30-09-20	woe 14-10-20	88
92	92	Opstellen opleverdossier	10 dagen	woe 30-09-20	woe 14-10-20	91GB
93	93	Oplevering	1 dag	vri 09-10-20	vri 09-10-20	92GB+6 dagen
